# ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング名 | No. 1 | 調査位置 | 岡崎市裝川町地内 | | | | | 北緯 | |
| 発注機関 | 岡崎市開発部組合指導課 | | | 調査期間 | 平成 年 月 日～ 年 月 日 | | | 東経 | |
| 調査業者名 | 財団法人愛知県都市整備協会 電話 (052-951-1467) | 主任技師 | | 現場代理人 | | コア鑑定者 | 坂倉 政樹 | ボーリング責任者 | |
| 孔口標高 | +36.11m | 角度 | 180° 上 90° 下 0° | 方向 | 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 | 地盤勾配 | 水平 0° 鉛直 90° | 使用機種 | |
| 総掘進長 | 10.22m | | | | | | | 試錐機 | カノボーリングKR50H |
| | | | | | | | | エンジン | ヤンマーNFD9 |
| | | | | | | | | ハンマー落下用具 | コーンブーリー |
| | | | | | | | | ポンプ | カノーV5P |

| 標尺 m | 標高 m | 層厚 m | 深度 m | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 相対密度 | 相対稠度 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35.21 | 0.90 | 0.90 | | 盛土・砂混じりシルト | 黒～灰 | 非常に緩い | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 33.31 | 1.90 | 2.80 | | 砂礫 | 褐灰 | 中位の | | |
| 3 | 32.26 | 1.05 | 3.85 | | 極強風化礫岩 | 褐 | 中位の | | |
| 4 | 31.31 | 0.95 | 4.80 | | 極強風化砂岩 | 褐灰 | 中位の | | |
| 5 | | | | | 極強風化砂質片岩 | 褐～淡褐灰 | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 25.89 | 5.42 | 10.22 | | | | | | |

孔内水位m／測定月日: 1.63 m

| 深度 m | 10cm毎の打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 cm | N値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 |
| 1.45 | | | | 30 | |
| 2.15 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 2.45 | | | | 30 | |
| 3.15 | 6 | 10 | 12 | 28 | 28 |
| 3.45 | | | | 30 | |
| 4.15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 4.45 | | | | 30 | |
| 5.15 | 12 | 10 | 12 | 34 | 34 |
| 5.45 | | | | 30 | |
| 6.15 | 12 | 26 | 12 | 50 | 50 |
| 6.38 | | | 3 | 23 | |
| 7.15 | 16 | 18 | 16 | 50 | 50 |
| 7.37 | | | 2 | 22 | |
| 8.05 | 50 | | | 50 | 50 |
| 8.15 | | | | 10 | |
| 9.15 | 30 | 20 | | 50 | 50 |
| 9.31 | | 6 | | 16 | |
| 10.15 | 50 | | | 50 | 50 |
| 10.22 | 7 | | | 7 | |

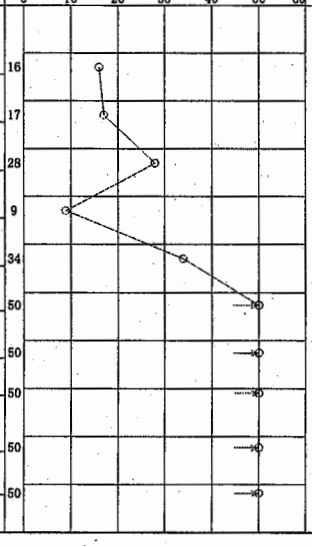


| 原位置試験 深度 m | 試験名および結果 | 試料採取 深度 m | 試料番号 | 採取方法 | 室内試験（ ） | 掘進月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
