ボーリング柱状図

調査名　恵田学区こどもの家　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	岡崎市恵田町字三月ヶ入７１－２			北緯	
発注機関				調査期間	平成4年12月21日～4年12月22日	東経	
調査業者名	株式会社応用地学研究所	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	浜田　泰治
孔口標高	GH -0.09m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	船 水平 0° 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	11.30m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
	-0.49	0.40	0.40		表土	黄褐				
1					シルト質細砂	褐				
2	-2.99	2.50	2.90							
3					マサ土	褐～淡褐				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	-11.39	8.40	11.30							
12										
13										
14										

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	2	3	3	8	8
1.45				30	
2.15	3	3	4	10	10
2.45				30	
3.15	5	6	7	18	18
3.45				30	
4.15	7	8	10	25	25
4.45				30	
5.15	12	16	17	45	45
5.45				30	
6.15	14	17	16	47	47
6.45				30	
7.15	10	16	20	46	46
7.45				30	
8.15	11	15	18	44	44
8.45				30	
9.15	17	18	5	40	40
9.38			3	23	
10.15	24	26		50	50
10.33		8		18	
11.15	31	19		50	50
11.30		5		15	

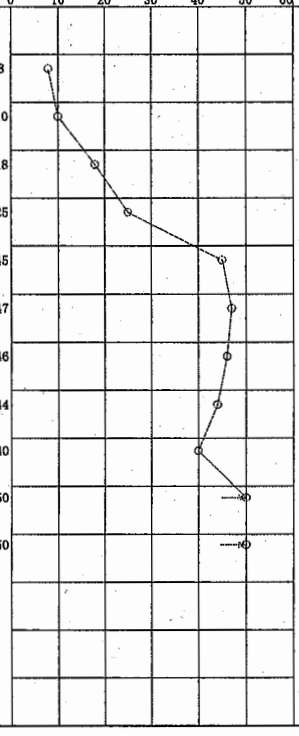

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
