# ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング名 | NO.8 | 調査位置 | 岡崎市箱柳町地内 | | | 北緯 | |
| 発注機関 | | | | 調査期間 | 平成6年10月4日～6年10月5日 | 東経 | |
| 調査業者名 | 東健ジオテック | 主任技師 | | 現場代理人 | | コア鑑定者 | | ボーリング責任者 | |
| 孔口標高 | H +64.29m | 角度 | 180° 上 90° 下 0° | 方向 | 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 | 地盤勾配 | 水平 0° 船首 90° | 使用機種 | 試錐機 | | ハンマー落下用具 | |
| 総掘進長 | 8.00m | | | | | | | | エンジン | | ポンプ | |

| 標尺 m | 標高 m | 層厚 m | 深度 m | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 相対密度 | 相対稠度 | 記事 | 孔内水位m／測定月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 盛土 | 暗褐～暗青灰～暗灰黄褐 | | | | |
| 2 | 61.69 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| 3 | | | | | 真砂 | 白灰～淡褐灰～白灰 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 58.59 | 3.10 | 5.70 | | | | | | | |
| 6 | | | | | 風化花崗岩 | 淡褐灰 | | | | |
| 7 | 56.29 | 2.30 | 8.00 | | | | | | | |

標準貫入試験

| 深度 m | 10cm毎の打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 cm |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1.45 | 5 | 15 | | 30 |
| 2.15 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2.45 | | | | 30 |
| 3.15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3.45 | | | | 30 |
| 4.15 | 24 | 26 | | 50 |
| 4.29 | | 4 | | 14 |
| 5.00 | 50 | | | 50 |
| 5.00 | 0 | | | 0 |
| 6.00 | 50 | | | 50 |
| 6.00 | 0 | | | 0 |
| 7.00 | | | | |
| 8.00 | 50 | | | 50 |
| 8.00 | 0 | | | 0 |

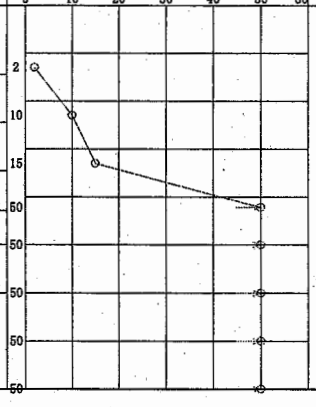


| 原位置試験 深度 m | 試験名および結果 | 試料採取 深度 m | 試料番号 | 採取方法 | 室内試験（ ） | 掘進月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
